

Banque africaine de développement

Planification de la passation des marchés

Guide

Novembre 2020



Département des services fiduciaires et de l'inspection (SNFI)
Banque africaine de développement (www.afdb.org)
Siège - Abidjan (Côte d'Ivoire)
5 Avenue Joseph Anoma
01 B.P. 1387, Abidjan 01
Côte d'Ivoire
E-mail : procurementpolicy@afdb.org

Ce document est protégé par le droit d'auteur.

Le présent document ne peut être utilisé ou reproduit qu'à des fins non commerciales. Toute utilisation commerciale, y compris et sans réserve, la revente, l'accès payant, la redistribution ou l'élaboration des œuvres dérivées, telles que des traductions non officielles du présent document, est interdite.

PREFACE

Le présent Guide (GN, pour son sigle en anglais) est proposé dans le but d'aider les emprunteurs et les bénéficiaires principaux de la Banque à préparer de manière adéquate les plans de passation de marchés pour les projets entièrement ou partiellement financés par la Banque ou par des fonds administrés par la Banque. Ce Guide reflète l'approche axée sur les risques telle que prévue dans la Politique de passation de marchés de la Banque, afin de s'assurer que les arrangements qui en résultent soient adaptés à l'objectif recherché, consistant à obtenir un rapport qualité-prix optimal. Une planification efficace de la passation de marchés est essentielle pour atténuer les risques, garantir l'équité et la transparence et réduire les délais de traitement. Ce document contient les modèles de Plans de passation de marchés nécessaires à l'usage des emprunteurs.

Il est conseillé aux utilisateurs de ce Guide de se familiariser avec les sections C3 et C4 du volume 1 de la partie A de l'OPM ainsi qu'avec l'annexe C2 du volume 3 de la partie A de l'OPM qui traite de ce sujet. Ce Guide fait partie de la Boîte à outils de la passation de marchés du Cadre de Passation de Marchés de la Banque.

ACRONYMES

AF	Accord de financement
AGPM	Avis général de passation de marchés
AOO	Appel d'offres ouvert
AOR	Appel d'offres restreint
DAO	Dossier d'appel d'offres
FfP	Adapté à l'objectif recherché
OE	Organe d'exécution du projet
OPM	Manuel des opérations de passation de marchés
MDP	Matrice de délégation de pouvoirs
PME	Petites et Moyennes Entreprises
PMP	Méthodes et Procédures de passation de marchés
PMR	Pays membres régionaux
PPM	Plan de Passation de Marchés
REP	Rapport d'évaluation du projet
SPM	Spécialiste en Passation de Marchés
SPME	Système de passation de marchés de l'Emprunteur

Table des matières

PREFACE.....	4
ACRONYMES	5
1. Introduction.....	7
2. Planification et Cycle du Projet.....	8
3. Examen des objectifs du Projet.....	9
4. Évaluation de l'Environnement Opérationnel	9
5. Analyse de Marché.....	10
6. Approche axée sur le risque comme base de la planification	11
7. Arrangements de Passation de Marchés.....	11
8. Délais standards du processus de passation de marchés.....	14
9. Plan de passation de marchés	15
9.1 Généralités	15
9.2 Format détaillé du PPM	16
9.3 Format simplifié du PPM	17
9.4 Format du PPM pour l'AF	17
10. Responsabilités.....	18
10.1 L'Emprunteur	18
10.2 La Banque	18
ANNEXE A - Diagramme de Planification de la Passation de Marchés	20
ANNEXE B1 - Délais de traitement (Biens, Travaux).....	21
ANNEXE B2 - Délais de traitement (Services de Consultants)	23
ANNEXE C1 - Plan détaillé de Passation de Marchés (Biens, Travaux).....	25
ANNEXE C2 - Plan détaillé de Passation de Marchés (Consultants)	26
ANNEXE D - Plan simplifié de Passation de Marchés	27
ANNEXE E - Plan de Passation de Marchés (pour l'Accord de financement).....	28

1. Introduction

- 1.1. Les Emprunteurs de la Banque, en tant que propriétaires des projets financés par la Banque, sont chargés de s'assurer que les projets sont gérés et mis en œuvre efficacement pour atteindre le meilleur rapport qualité-prix (VfM) et leurs objectifs de développement. La Banque est mandatée par l'accord qui l'établit, de veiller à ce que le produit de tout prêt accordé par elle soit consacré exclusivement aux fins pour lesquelles le financement a été accordé, en tenant dûment compte des considérations d'économie et de rendement et sans laisser intervenir des influences ou considérations politiques ou extra-économiques. Afin d'atteindre ces deux objectifs, la Banque demande à ses Emprunteurs, entre autres, de suivre les bonnes pratiques de planification de la passation de marchés, comme le souligne la « Politique de passation de marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque, octobre 2015 », section 11.1 (Encadré 1).

Encadré 1 : Clause 11.1 de la Politique de passation de marchés

Plan de passation de marchés. La préparation d'un plan de passation des marchés (PPM) réaliste est un élément crucial pour le succès de la mise en œuvre et du suivi d'un projet. Ce PPM doit être élaboré en coordination avec le plan global et le manuel de mise en œuvre du projet, au cours des premières étapes de la préparation du projet et doit être lié à la stratégie globale de passation des marchés de l'Emprunteur. Il tient compte des processus internes d'examen des projets de l'Emprunteur et de la Banque, en particulier en matière d'évaluation des capacités et des risques, et décrit les modalités de mise en œuvre du projet (structure organisationnelle et responsabilités appropriées, calendrier de passation des marchés et plan de décaissement associé, seuils d'examen, nature et portée de la supervision et des audits de la Banque et, plus généralement, suivi et évaluation (S&E) et production des rapports).

- 1.2. La Politique confère en outre aux Emprunteurs la responsabilité de préparer un Plan de passation de marchés (PPM) et de le soumettre à la Banque pour approbation avant les négociations, et de le suivre de près pendant la mise en œuvre du projet tout en y apportant des mises à jour et modifications, afin de continuer à s'assurer que tous les arrangements de passation de marchés restent adaptés à l'objectif recherché (FfP) et que, par conséquent, l'Emprunteur obtienne de meilleurs résultats en termes de rapport qualité-prix optimal. (Encadré 2).

Encadré 2 : Politique de passation de marchés, Clause 11.1 (Suite)

Dans le cadre de la préparation du projet, la Banque exige par conséquent que l'Emprunteur prépare et soumette à son approbation un PPM détaillé, même provisoire, pour la portée complète du projet. L'Emprunteur devra mettre en œuvre le PPM approuvé ainsi que toute mise à jour et modification approuvée ultérieurement par la Banque. Après la négociation du financement, la Banque organisera la publication du PPM initial approuvé et de toutes les mises à jour ultérieures sur son site Web externe. La Banque peut également accepter un PPM simplifié pour les petits dons et fonds fiduciaires, en fonction de leur portée, de leur complexité et de leur taille.

- 1.3. Par conséquent, une bonne planification de la passation de marchés comprend l'exécution des activités suivantes :
- Identifier et évaluer les besoins ;

- Entreprendre une analyse détaillée du marché au niveau du secteur afin d'obtenir une appréciation précise de la nature des entrepreneurs, fournisseurs, prestataires de services et consultants nationaux et internationaux pour les composantes et activités du projet envisagé ;
 - Déterminer les catégories de dépenses pour les biens, les travaux et les services, déterminer les critères pour un regroupement (packaging) efficace des contrats, et établir les lots et les ensembles de contrats ;
 - Ventiler et calculer les coûts estimatifs pour chaque catégorie de marché au niveau des ensembles et des lots, en tenant compte notamment des imprévus physiques et de la hausse des prix ;
 - Déterminer une stratégie de passation de marchés pour le projet en fonction des exigences de l'Emprunteur ;
 - Déterminer les méthodes et procédures de passation de marchés les mieux adaptées qui permettraient d'obtenir un rapport qualité-prix optimal ;
 - Définir les mécanismes de contrôle les mieux appropriés pour les acquisitions ;
 - Synthétiser les arrangements de passation de marchés dans un PPM.
- 1.4. Ce Guide se concentre sur les bonnes pratiques de planification de la passation de marchés. Il est destiné à aider les utilisateurs dans le processus structuré de planification de la passation de marchés pour les projets financés entièrement ou partiellement par un prêt ou un don de la Banque, ou par des fonds administrés par la Banque, qui sont régis par la Politique de passation de marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque, approuvée en octobre 2015 et telle que modifiée de temps à autre.
- 1.5. Le présent document complète la Méthodologie de mise en œuvre de la politique de passation de marchés de la Banque africaine de Développement dans sa section 3 ; la Préface du volume 1 de la partie A de l'OPM ; le chapitre C, sections C3 et C4 du volume 1 de la partie A de l'OPM ; ainsi que l'annexe C2 du volume 3 de la partie A de l'OPM, auxquels le lecteur est invité à se référer.
- 1.6. La préparation du Plan de passation de marchés est une activité de collaboration sous la responsabilité de l'Emprunteur. Dans le cas où l'Emprunteur n'a pas identifié un responsable de la passation de marchés pour le projet, le Spécialiste en passation de marchés (SPM) de la Banque peut exceptionnellement aider à la préparation du Plan de passation de marchés.

2. Planification et Cycle du Projet

- 2.1. Pour que la planification de la passation de marchés soit efficace, le plan doit être élaboré progressivement au cours des différentes étapes du cycle du projet. Il ne devrait pas s'agir d'un exercice en une seule étape effectué lors de l'évaluation. Il est donc développé comme suit :
- Étape d'identification : L'identification et l'évaluation des besoins sont effectuées ;
 - Étape de préparation : Il s'agit essentiellement de la phase de conception technique du projet au cours de laquelle, inter alia, l'analyse de marché au niveau sectoriel est effectuée, les différentes évaluations diagnostiques (au niveau du pays, du secteur, du projet et de l'OE) sont mises à jour ou préparées, les estimations de coûts sont établies pour les composantes et les sous-composantes et le regroupement de marchés (packaging) est initialement entrepris conduisant à la sélection de méthodes, de procédures et de mécanismes de contrôle provisoires

pour des transactions spécifiques ou des groupes de transactions similaires dans le cadre du projet ;

- Étape d'évaluation, de négociation et d'approbation par le Conseil d'administration: Une évaluation complète de la viabilité technique, économique, financière et environnementale du projet est effectuée, les méthodes et procédures de passation de marchés sont confirmées, des modalités de contrôle sont instituées et le PPM est finalisé, convenu et intégré dans le Rapport d'évaluation du projet (REP) et l'Accord de financement (AF). Ceux-ci sont ensuite approuvés par le Conseil d'administration ;
- Étape de mise en œuvre du projet ou du programme : Le PPM sert notamment à gérer l'exécution du projet ou du programme. Il est périodiquement examiné et révisé pour s'assurer que ses dispositions restent adaptées à l'objectif recherché compte tenu de toute évolution de la situation du projet ;
- Étape d'achèvement du projet : Le PPM permet enfin de déterminer la performance de l'exécution du projet et d'évaluer la réalisation des Objectifs de développement du projet.

- 2.2. Le processus de planification est un processus dynamique qui permet d'optimiser le rapport qualité-prix dans le cadre du projet en réexaminant périodiquement le PPM pendant la mise en œuvre du projet, afin de s'assurer que ses éléments demeurent adaptés à l'objectif recherché, en cas notamment de changement dans les circonstances du projet ou du programme ou après une certaine période de mise en œuvre du projet.

3. Examen des objectifs du Projet

- 3.1. Un Plan de passation de marchés adéquat est le résultat d'une approche systématique fondée sur les risques, comprenant une évaluation de l'environnement opérationnel, une analyse du marché, l'identification et la gestion des risques, et la définition de la stratégie de passation de marchés dans le but de s'assurer que les procédures, méthodes et modalités de passation de marchés sont adaptées à l'objectif recherché et permettent d'obtenir un rapport qualité-prix optimal.
- 3.2. À cet égard, le processus d'élaboration du PPM exige une bonne compréhension des buts et objectifs du projet. Ces informations sont généralement disponibles dans la Note conceptuelle du projet et dans d'autres documents soumis par l'Emprunteur.
- 3.3. Ce processus d'examen dans Le cadre de l'élaboration du PPM comprendra une implication totale de l'équipe de projet du pays et du Chargé de projet afin d'obtenir leurs points de vue et perspectives sur le secteur et toute contrainte spécifique liée à la passation de marchés qui pourrait avoir une incidence sur les objectifs du projet.

4. Évaluation de l'Environnement Opérationnel

- 4.1. La préparation d'un PPM nécessite une évaluation des capacités et des ressources de l'entité chargée de la mise en œuvre afin d'identifier les facteurs susceptibles d'affecter la stratégie de passation de marchés en cours d'élaboration. L'objectif est d'élaborer des mesures d'atténuation dans le cas où des lacunes en matière de capacités sont identifiées. Ces mesures peuvent inclure la formation, l'assistance technique, etc. afin d'assurer une exécution efficace du projet.

- 4.2. L'évaluation doit également inclure les parties prenantes internes qui seront impliquées dans le projet en général et dans le processus de passation de marché en particulier. Il s'agit notamment des organes de contrôle des marchés publics, en charge des mécanismes de traitement des plaintes, de l'institution en charge de l'audit des finances publiques, etc. L'objectif est de s'assurer qu'ils sont impliqués dès le départ avec une compréhension adéquate des attentes à leur égard, et afin d'obtenir leur pleine participation dans la mise en œuvre du projet.
- 4.3. Selon la nature du projet, cette étape doit également prendre en compte les parties prenantes externes de l'Emprunteur, notamment les organisations de la société civile, les soumissionnaires, les communautés locales concernées par l'opération, etc.
- 4.4. Une analyse SWOT (ou AFOM : Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces) peut être menée pour obtenir une description claire des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'environnement opérationnel. Le résultat contribuera à l'élaboration de la stratégie de passation de marchés du projet.

5. Analyse de Marché

- 5.1. Une analyse de marché est réalisée dans le but d'avoir une compréhension adéquate de la structure du secteur concerné et de son fonctionnement afin d'adapter de manière appropriée les ensembles de contrats envisagés en fonction des conditions des marchés cibles.
- 5.2. L'analyse vise également à déterminer la capacité du marché à répondre aux besoins et aux Objectifs de développement du projet tout en évaluant la nature et le niveau de la concurrence dans le secteur cible. Le processus se concentrera sur les conditions, la taille et l'étendue des marchés cibles, ainsi que sur le niveau de risque lié à la passation de marchés, afin d'établir des valeurs monétaires indicatives spécifiques au secteur, et de procéder à une distinction entre les travaux, les biens et les services autres que les services de consultants, et les services de consultants.
- 5.3. Le processus est principalement mené par le personnel de la Banque chargé de la passation de marchés, avec l'aide, le cas échéant, des économistes de la Banque dans les pays et du personnel sectoriel pour les conseils et les informations techniques. L'analyse implique principalement un travail documentaire, l'examen des informations existantes et accessibles au sein de la Banque ou auprès des partenaires de développement, ainsi que des informations pertinentes provenant de l'Emprunteur, y compris des représentants du secteur privé et de la société civile du pays, notamment les chambres de commerce et autres associations professionnelles représentatives, les organisations commerciales, les organisations de soutien aux entreprises et les fédérations du secteur concerné.
- 5.4. Les résultats de l'analyse du marché sectoriel sont utilisés pour identifier les sous-composantes, les activités, les transactions spécifiques ou les groupes de transactions similaires et les contrats qui constitueront le projet ; en les regroupant en grandes catégories indicatives qui seraient susceptibles de suivre des Méthodes et procédures de passation de marchés (PMPs) similaires et enfin en préparant des lots indicatifs de marchés pour le projet.


6. Approche axée sur le risque comme base de la planification

- 6.1. Le Cadre de Passation de marchés de la Banque établit une approche axée sur le risque comme base pour atteindre son objectif ultime d'optimisation du rapport qualité-prix pour les Emprunteurs. La gestion des risques est le processus qui consiste à identifier et à minimiser la probabilité et l'impact des risques encourus dans le cadre d'un projet.
- 6.2. L'évaluation et la gestion des capacités et des risques liés à la passation de marchés (PROCGRAM) est le principal outil utilisé pour déterminer la Notation des risques liés aux procédures de passation de marchés dans les projets (PPRR). Les risques liés à la passation de marchés, au niveau national, sont déterminés sur la base du BPAR, tandis que les risques au niveau sectoriel sont essentiellement identifiés par l'analyse de marché. En outre, une évaluation de la capacité et de la performance de l'Organe d'exécution est effectuée pour identifier les risques associés au niveau de l'Organe d'exécution du projet qui peuvent créer des problèmes potentiels de mise en œuvre.
- 6.3. La mise à jour des évaluations par pays et par secteur, les évaluations des capacités d'exécution, de la conformité, de la gestion et des performances de l'OE, fournissent les données nécessaires au calcul des risques liés à la passation de marchés.
- 6.4. Les différents risques identifiés sont ensuite mesurés en fonction de leur probabilité d'occurrence et de l'ampleur de leur impact sur les objectifs du projet. Cet exercice de mesure des risques se terminera par la détermination de la notation des risques liée à la passation de marché du projet.
- 6.5. La classification globale des risques qui découle de cette analyse permet d'identifier les mesures d'atténuation des risques au niveau du projet, de définir les indicateurs de suivi des risques et leur base de référence, et finalement de guider le processus de planification de la passation de marchés en établissant les arrangements de passation de marchés les plus appropriés pour le projet et, par la suite, le PPM spécifique au projet, en particulier l'identification des méthodes et procédures appropriées de la Banque, ainsi que le degré de recours au système national.

7. Arrangements de Passation de Marchés

- 7.1. La qualité du PPM dépend des données disponibles sur l'environnement de la passation de marchés. À cet égard, la préparation du PPM implique l'examen des dispositions relatives à la passation de marchés dans toute étude de conception existante, l'examen minutieux de toutes les estimations préliminaires de coûts disponibles, et également la prise en compte des caractéristiques et du degré de priorité des composantes du projet proposé, l'évaluation de leur caractère novateur ainsi que du degré de complexité des acquisitions potentielles.
- 7.2. Le regroupement de marchés (packaging) est une activité essentielle dans la planification de la passation de marchés. Le packaging optimal des acquisitions pour les projets et programmes vise à préparer et à s'assurer que le PPM est adapté à l'objectif recherché en déterminant :
 - si des marchés uniques, des lots de marchés de nature similaire, des marchés multiples ou groupés doivent être utilisés pour chaque catégorie d'acquisition ;

- le régime ou le système de passation de marché spécifique à utiliser, qu'il s'agisse du SPME, des PMPs de la Banque et/ou des PMPs de Tierce partie, ou d'une combinaison de ceux-ci ; et
 - si un Appel d'offres ouvert (AOO), un Appel d'offres restreint (AOR) ou d'autres Méthodes de passation de marchés (PMs) doivent être utilisés, ainsi que les Procédures de passation de marchés (PPrs) et les procédures et critères d'évaluation des offres correspondants – qui peuvent devenir relativement complexes, notamment lorsque le nombre d'offres et/ou de lots est élevé.
- 7.3. Le processus intègre des considérations sur les options de régime ou de systèmes de passation de marchés, le SPME étant le système par défaut. Dans ce cas, le SPM examine les PMPs indicatives en équilibrant les facteurs de valeur et de risque par rapport aux PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce partie, pour chaque transaction ou groupe de transactions similaires, tel que décrit dans les paragraphes suivants.
- 7.4. Pour les transactions de valeur faible qui présentent un risque insignifiant pour l'Emprunteur et la Banque, telles que les dépenses de fonctionnement, les ateliers, etc., les PMPs simples telles que les Demandes de Cotations (DC) ou la Consultation des Fournisseurs (CF) avec de Documents de sollicitation (DS) simples sans publicité sont envisagées. De tels processus relèveraient généralement du SPME s'ils sont jugés acceptables.
- 7.5. Pour les transactions de valeur élevée qui présentent un risque faible (par exemple, les travaux de génie civil courants, etc.), le SPME, les PMPs de la Banque ou de Tierce partie peuvent être envisagés.
- 7.6. Pour les contrats de valeur relativement faible et présentant un risque élevé (par exemple, un matériel hautement spécialisé, une mission de consultant pour une prestation hautement spécialisée, une supervision de travaux complexes, etc.), les PMPs de la Banque et de Tierce partie sont à envisager.
- 7.7. En revanche, pour les contrats de valeur élevée qui présentent un risque élevé à la fois pour l'Emprunteur et pour la Banque (par exemple, les travaux de génie civil / infrastructures complexes, y compris les barrages, les centrales électriques, les installations hydroélectriques, les établissements de santé, etc.), les méthodes et procédures d'AOO sont envisagées et les PMPs de la Banque ou de Tierce partie peuvent être utilisées.
- 7.8. Pour les processus de passation de marchés d'une complexité et de valeur importantes, les risques globaux sont élevés, et le processus de passation de marchés est complexe, et par conséquent les PMPs de la Banque doivent être utilisés.
- 7.9. La matrice ci-dessous présente à titre indicatif les options de méthodes de passation de marchés.

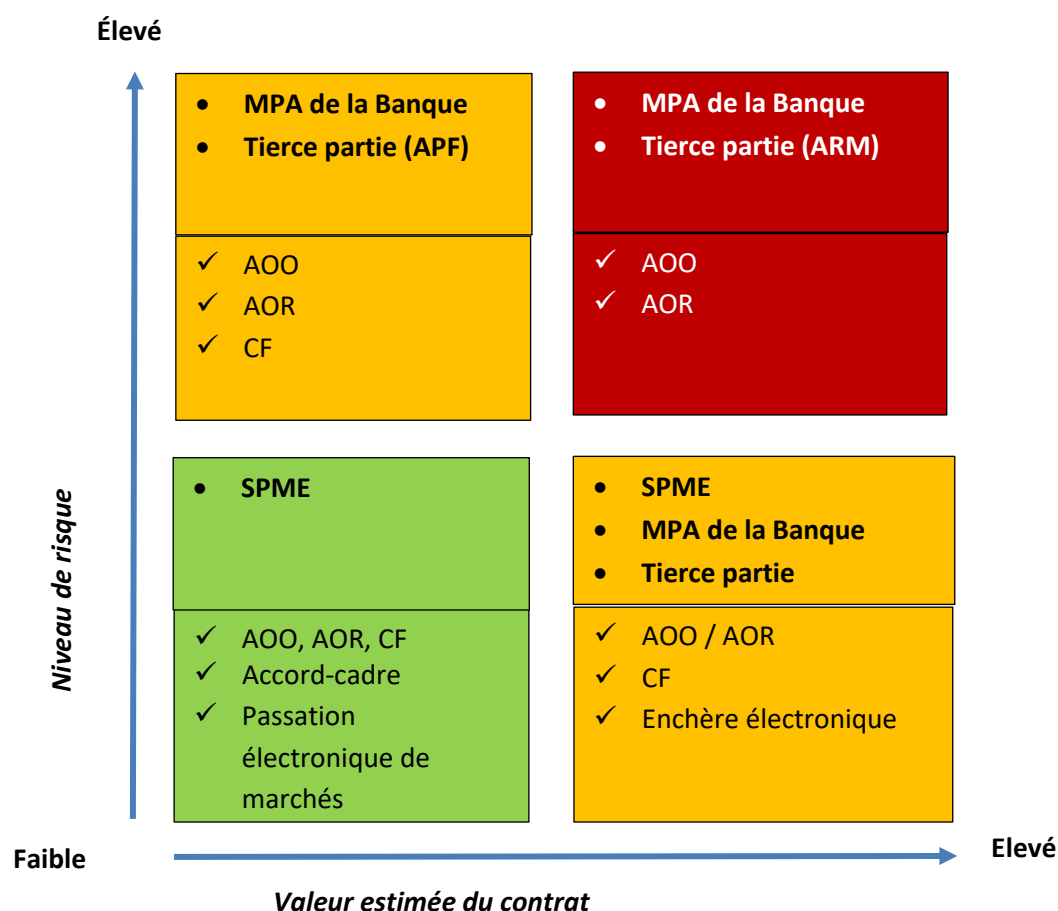

- 7.10. En outre, les dispositions de la Politique de passation de marchés de la Banque relatives à l'éligibilité, aux conflits d'intérêts, aux avantages compétitifs inéquitables, aux associations, ainsi que les objectifs socio-économiques spécifiques de l'Emprunteur et les dispositions connexes relatives à la passation de marchés, devraient être pris en considération. L'objectif est de veiller à ce qu'un examen spécifique approfondi des aspirations socio-économiques et durables de l'Emprunteur soit effectué, notamment en ce qui concerne l'utilisation des marges de préférence, l'aide aux PME, la création d'emplois, l'autonomisation des femmes et des groupes défavorisés. L'intégration de l'un ou l'autre de ces éléments dans le projet dépendrait de critères d'évaluation spécifiques, établis et objectifs, à intégrer dans le DAO. L'accord sur ces critères est reflété dans le PPM provisoire.
- 7.11. En outre, la préparation comprend l'élaboration de méthodes et de procédures provisoires de passation de marchés, ainsi que de procédures et critères d'évaluation. Pour l'essentiel, l'approche FfP visant à obtenir un rapport qualité-prix optimal devrait être appliquée pour chaque transaction spécifique ou pour des groupes de transactions similaires, en examinant, évaluant et équilibrant les compromis entre les 4 E (économie, efficacité, efficacité et équité) pour répondre aux différentes priorités et obtenir ainsi des solutions optimales de passation de marchés qui tiennent compte des besoins des Emprunteurs, des bénéficiaires et de toute tierce partie spécifique.
- 7.12. Les complexités du processus de décision du PPM sont illustrées dans l'Encadré 3.

Encadré 3 : OPM Partie A Préface paragraphe 17
Planification de la passation de marchés: Une illustration

Par exemple ; (i) au stade de la conception, les exigences techniques ne doivent être ni supérieures ni inférieures aux spécifications; (ii) lors de la détermination des méthodes et procédures de passation de marchés, il n'est pas nécessaire de faire appel à la concurrence internationale ouverte pour des transactions de faible valeur lorsqu'il existe dans le PMR un nombre approprié d'entreprises capables de présenter des offres requis ; il n'est pas également nécessaire de considérer la procédure d'Appel d'offres ouvert (AOO) comme obligatoire pour les acquisitions de très petite valeur lorsque les Demandes de prix/cotations (DC) se révèlent être les plus appropriées; et (iii) lors de la détermination des niveaux de contrôle, l'examen préalable ne devrait pas nécessairement être obligatoire pour les transactions dont le risque fiduciaire est faible. Par conséquent, l'application de la proportionnalité peut avoir pour résultat de permettre l'utilisation des approches normalisées pour les transactions de faible valeur, à faible risque ou de faible complexité tandis que des Méthodes & Procédures de passation de marchés personnalisées pourront être utilisées lorsque la complexité, le risque ou l'impact de la passation des marchés sont élevés. La détermination de la FfP est une tâche exigeante, car le processus est dynamique et il peut être nécessaire de réexaminer une décision sur la FfP après une certaine période ou si les conditions ont changé depuis que la décision initiale a été prise.

7.13. L'Emprunteur et la Banque conviennent de ce qui suit :

- Les PMPs, les procédures et critères d'évaluation des offres, et la finalisation du Plan de passation de marchés et des ensembles de contrats ;
- la détermination des dossiers types d'appel d'offres et des modèles de contrats ;
- les dispositions de la Banque en matière d'actions anticipées dans la passation de marchés et de financements rétroactifs ;
- les dispositions de lutte contre les pratiques interdites ; et
- les arrangements de passation de marchés pour la mise en œuvre des projets ; et
- les modalités de la Banque en matière de contrôle.

8. Délais standards du processus de passation de marchés

- 8.1. Un élément essentiel pour une planification efficace de la passation de marchés consiste à établir des délais réalistes et cohérents pour l'exécution des différentes activités du processus de passation de marchés. Il est important que ces délais soient fondés sur l'expérience acquise en tenant compte des exigences du Cadre de Passation de Marchés de la Banque et des principes fondamentaux de la commande publique en général. Compte tenu de la nature et la complexité des diverses catégories de dépenses comprenant i) les biens et travaux, y compris les services autres que les services de consultants, d'une part, et ii) les services de consultants à caractère intellectuel, d'autre part, des délais différents sont normalement établis pour chacune d'entre elles. Les premières catégories peuvent être ventilées séparément en biens, travaux et services autres que les services de consultants.
- 8.2. La Banque a établi des délais standard dans le processus de passation de marchés pour l'acquisition de biens, travaux, services autres que les services de consultants, ainsi que l'acquisition de services de consultants, conformément aux exigences du Cadre Passation de Marchés du Groupe de la Banque (2015), en utilisant les PMPs de la Banque, et ces délais sont indiqués à l'**annexe B**.

9. Plan de passation de marchés

9.1 Généralités

9.1.1. Le Plan de passation de marchés est un outil qui synthétise les modalités de passation de marchés retenues. À l'exception des prêts axés sur les politiques et les résultats, un PPM doit être convenu pour tous les projets d'investissement et pour tous les systèmes de passation de marchés (SPME, PMPs de la Banque, PMPs de Tierce partie). Un diagramme détaillant le processus de planification de la passation de marchés est proposé à l'annexe A.

Les livrables préparés et convenus avec l'Emprunteur et son OE à la fin de l'évaluation du projet relativement à la planification de la passation de marchés comprennent :

- Le PPM détaillé finalisé comprenant toutes les composantes, sous-composantes, les différentes catégories de dépenses, les lots, les marchés et les groupes de marchés similaires convenus ;
- les régimes ou systèmes de passation de marchés spécifiques pour chaque ensemble (package), lot, marché ou groupe de marchés similaires, assortis de méthodes et procédures de passation de marchés, de procédures et critères d'évaluation des offres ;
- la conception finale du projet, l'étendue des travaux, les spécifications et/ou les TdR ;
- la finalisation des estimations de coûts détaillées pour chaque composante, ensemble (package), lot, marché ou groupe de marchés similaires ;
- le calendrier de toutes les procédures de passation de marchés ;
- la détermination des types de documents d'appel d'offres, y compris les modèles de contrats associées ;
- les procédures opérationnelles standards avant soumission, à l'étape des soumissions, et après l'étape des soumissions pour toutes les catégories de dépenses ;
- les projets d'AGPM et AAO pour tous les ensembles (packages), lots, marchés et groupes de marchés similaires spécifiques ;
 - les arrangements de passation de marchés pour les composantes du projet, les marchés ou les groupes de marchés similaires faisant l'objet d'un cofinancement parallèle ou conjoint, y compris les PMPs de Tierce partie.

9.1.2. En règle générale, le résultat du processus de planification des marchés est le PPM détaillé qui est intégré dans la Section relative à la passation de marchés dans le REP et l'AF.

Pour faciliter de manière proactive la mise en œuvre de ses mandats fiduciaire et de développement, notamment en aidant l'Emprunteur à administrer son projet, la Banque a élaboré trois modèles différents de PPM à utiliser dans la préparation, l'évaluation et la mise en œuvre des projets et des programmes.

9.1.3. Cette action a été dictée par le fait que la Banque requiert qu'un PPM détaillé couvrant toute la portée du projet, même provisoire, soit préparé par l'Emprunteur et soumis à la Banque pour approbation (Encadré 2). Par conséquent, ces modèles fournissent des orientations aux Emprunteurs et assurent en même temps la standardisation et l'harmonisation de la planification de la passation de marchés pour l'ensemble des projets et programmes financés par le Groupe de la Banque. Les détails du processus de la passation de marchés sont indiqués dans le PPM de l'Emprunteur pour une période initiale de 18 mois.

9.1.4. Les trois versions du PPM comprennent :

- **Version détaillée (Modèle détaillé du PPM)** : Le PPM détaillé comprend :
 - ✓ une description des biens, travaux et services à acquérir ;
 - ✓ Coût estimatif du marché ou du lot ;
 - ✓ les régimes ou systèmes de passation de marchés (SPME, PMPs de la Banque ou de Tierce partie) ;
 - ✓ les méthodes proposées pour la passation de marchés ou la sélection ;
 - ✓ la préférence nationale ou régionale, si applicable ;
 - ✓ les modalités de contrôle (examen) de la Banque (examen préalable ou a posteriori),
 - ✓ les calendriers détaillés pour le traitement des activités de passation de marchés, et
 - ✓ toute autre information que la Banque peut raisonnablement exiger.

Le PPM détaillé est la version examinée au cours des négociations, à mettre à jour pendant la mise en œuvre, et pour la supervision et le suivi de l'exécution du projet.

- **Version simplifiée (modèle Web PPM)** : Ce modèle est essentiellement destiné aux PMPs de la Banque et adopte le même format que la version détaillée, mais ne comprend que les principaux délais de traitement. Cette version est utilisée à des fins de publication sur le site Web de la Banque ; et
- **Version résumée (modèle AF du PPM)** : Ce modèle, à insérer dans l'Accord de financement (AF), comprend une description générale ou moins détaillée des biens, travaux et services, les estimations de coûts, les régimes de passation de marchés et les PMPs, ainsi que les mécanismes de contrôle. Les délais ne sont généralement pas inclus.

9.1.5. Une cohérence doit être assurée entre le PPM et la stratégie de passation de marchés du projet, le Manuel d'exécution du projet et tout document de mise en œuvre du projet disponible et applicable. Le PPM détaillé étant la version de base, il doit toujours y avoir une cohérence totale avec la version simplifiée du PPM et la version du PPM pour l'AF.

9.1.6 Conformément au Cadre de Passation de Marchés de la Banque, l'Emprunteur doit mettre à jour le PPM, annuellement ou selon les besoins, pendant toute la durée d'exécution du projet, afin de refléter : i) les besoins réels de mise en œuvre du projet ; ii) toute amélioration ou toute autre amélioration de la capacité institutionnelle ; et iii) les estimations de coûts actualisées (Encadré 2).

9.2 Format détaillé du PPM

9.2.1. Le PPM détaillé est normalement préparé par l'OE, à partir de la préparation du projet, et est finalisé au moment de l'évaluation du projet ou au plus tard au moment de la négociation du prêt ou du don. Il doit couvrir l'ensemble de la portée du projet et comprendre les exigences en matière de classement et d'enregistrement, en attribuant les responsabilités pour toutes les étapes du processus de passation de marchés pour chaque transaction.

9.2.2. La Banque fait la distinction entre les détails et les différences dans le traitement de la passation de marchés de biens et de travaux, y compris les services autres que les services de consultants, d'une part, et de services de consultants, d'autre part, en fournissant un modèle détaillé distinct pour chacun. Ces modèles sont utilisés par les Emprunteurs et la Banque principalement pour entreprendre une administration, une

mise en œuvre, un suivi et un contrôle plus approfondis du projet ou du programme. Le modèle détaillé du PPM résume les différentes étapes de la passation de marchés pour chaque ensemble, marché ou groupe de marchés similaires, en les ventilant en lots, le cas échéant, pour chaque étape de traitement de la passation de marchés. Il fournit des informations concernant le traitement de chaque marché au cours de la période initiale de planification de la passation de marchés. Il enregistre toute révision effectuée pendant l'exécution du projet et il documente l'exécution effective jusqu'à l'achèvement du projet ou du programme. Ces informations permettent essentiellement de respecter pleinement les délais du processus de passation de marchés.

- 9.2.3. Les 18 premiers mois du plan devraient être basés sur une conception détaillée du projet et sur des estimations de coûts, et devraient par conséquent être précis à hauteur de plus ou moins 10 % des coûts du projet. D'autre part, la période restante du projet peut être basée sur des estimations plus larges lorsque ces détails ne sont pas disponibles.
- 9.2.4. Le modèle détaillé du PPM permet de saisir les différences entre la planification, les éventuelles révisions et la réalité de l'exécution du projet, pour des besoins futurs. Il est important que, dans le PPM, les calendriers établis lors de l'évaluation et convenus lors de la négociation du projet soient maintenus sur l'axe « Plan » et ne soient pas modifiés ou révisés, à tout moment de la période d'exécution du projet. Toute révision doit être indiquée sur l'axe « Révisions ». Ces révisions peuvent être modifiées à nouveau tout au long du projet.
- 9.2.5. Le PPM doit être révisé périodiquement (annuellement) par l'Emprunteur en fonction du calendrier réel d'exécution du projet, et ces révisions doivent être affinées et approuvées au cours des missions de supervision du projet par la Banque.
- 9.2.6. Ce plan détaillé n'est pas publié sur le site Web de la Banque.
- 9.2.7. Le modèle de la version détaillée du PPM pour les biens et travaux incluant des services autres que les services de consultants figure à l'**annexe C1**, tandis que celui pour les services de consultants est fourni à l'**annexe C2**.

9.3 Format simplifié du PPM

- 9.3.1. La version simplifiée du PPM résume les principales informations requises par la clause 11.1 de la Politique de passation de marchés. Elle inclut également les dates prévisionnelles d'intérêt majeur pour les soumissionnaires (publication de l'appel d'offre et date de début du contrat) en plus d'une colonne « Commentaire » qui sera utilisée pour introduire toute information supplémentaire non fournie dans les colonnes existantes, mais nécessaire et utile pour les soumissionnaires potentiels.
- 9.3.2. Le PPM simplifié convenu et mis à jour est publié sur le site Web de l'OE, s'il existe. La Banque publie ce PPM, ainsi que les attributions de marchés, sur son site Web accessible au grand public.
- 9.3.3. Le modèle de la version simplifiée du PPM est présenté à l'**annexe D**.

9.4 Format du PPM pour l'AF

- 9.4.1. La version AF du PPM doit contenir les exigences de la clause 11.1 de la Politique de passation de marchés qui constituent les éléments juridiques essentiels du PPM, notamment :

- le régime ou système de passation de marchés ;
- la description des biens, travaux et services ;
- l'estimation des coûts ;
- les méthodes et procédures de passation de marchés ;
- les modalités de contrôle de la Banque.

- 9.4.2. Afin de permettre sa concrétisation, un premier projet de PPM doit être approuvé à la fin de la phase d'évaluation du projet ou, au plus tard, avant la négociation de l'AF. Toutes les PPMs déterminées comme les mieux adaptées et donc nécessaires pour obtenir un rapport qualité-prix optimal dans la mise en œuvre du projet doivent être énoncées dans l'AF. La version AF du PPM doit résulter du PPM détaillé tel que convenu lors des négociations. Elle est intégrée à l'AF et est donc juridiquement contraignante pour les deux parties. Les mises à jour régulières du PPM ne peuvent prendre en compte que les Méthodes de passation de marchés (PMs) autorisées par celui-ci, y compris celles qui ont été convenues dans le cadre du SPME.
- 9.4.3. Les Procédures de passation de marchés (PPRs), y compris les procédures et critères d'évaluation des offres, peuvent toutefois être revus lors des audits annuels, comme convenu entre l'Emprunteur et la Banque. Des Méthodes de passation de marchés supplémentaires peuvent être envisagées, si les circonstances du projet l'exigent, par le biais d'un PPM modifié. Une violation du PPM peut donner lieu à des sanctions en vertu de l'AF.
- 9.4.4. Le modèle de la version AF du PPM est décrit à l'**annexe E**.

10. Responsabilités

10.1 L'Emprunteur

- 10.1.1. L'Emprunteur est responsable de la préparation du Plan de passation de marchés initial détaillé, basé sur sa stratégie nationale de passation de marchés, la stratégie et le plan de faisabilité et de mise en œuvre du projet, et la capacité de son entité de mise en œuvre. Après discussion avec la Banque, l'Emprunteur doit finaliser le plan détaillé conformément à la clause 11.1 de la Politique de passation de marchés (Encadré 1). Parallèlement au PPM, l'Emprunteur prépare également l'AGPM pour le projet ou le programme, prêt à être discuté lors de la négociation du projet.
- 10.1.2. Pendant l'exécution du projet, l'équipe de coordination du projet doit utiliser le PPM détaillé pour gérer et faire le suivi de l'administration du projet. L'équipe propose des mises à jour à mesure que l'exécution du projet avance et que la situation évolue dans le but de s'assurer que le PPM reste adapté à l'objectif visé et qu'il permet de réaliser un rapport qualité-prix optimal.

10.2 La Banque

- 10.2.1. **Aide à la préparation du PPM** : il incombe au SPM et au Chargé de projet d'assister l'OE de l'Emprunteur dans la préparation du PPM détaillé et l'AGPM pendant la préparation et l'évaluation du projet (paragraphe 5.1.1).
- 10.2.2. **Négociation du PPM** : pendant la négociation du prêt ou du don, le SPM et le Chargé de projet ont la responsabilité des discussions et de la conclusion d'un accord avec l'Emprunteur sur le PPM détaillé.
- 10.2.3. Le PPM détaillé convenu est approuvé par la Banque (conformément à la Matrice de délégation de pouvoirs - MDP) et intégré dans le REP. Parallèlement, les colonnes

pertinentes sont extraites pour former la version AF qui doit être incluse dans l'AF. Cette conversion relève de la responsabilité conjointe du SPM, du Chargé de projet et du Juriste responsable du projet.

- 10.2.4. Dans le cadre d'une activité connexe menée pendant la négociation du projet, le SPM et le Chargé de projet examinent l'AGPM soumis par l'Emprunteur, suggèrent les modifications éventuelles et, une fois finalisé, l'approuvent (conformément à la MDP) à la fin des négociations et le prépare pour la publication.
- 10.2.5. **Publication du PPM** : après approbation du prêt ou du don par le Conseil d'administration, le Chargé de projet, en tant que propriétaire du projet à la Banque, transmet la version simplifiée du PPM et l'AGPM convenus entre la Banque et l'Emprunteur lors des négociations, au SPM avec copie au RPC et au ROM selon le cas. Il incombe au SPM de veiller à ce que la version simplifiée du PPM (y compris les mises à jour) et l'AGPM soient publiés sur le site Web de la Banque. Dans le cas d'une action anticipée en vue d'acquisition, la publication du PPM et de l'AGPM doit intervenir avant l'approbation du financement.
- 10.2.6. **Utiliser le PPM pendant la mise en œuvre du projet** : Le SPM et le Chargé de projet doivent utiliser le PPM détaillé comme un outil critique et essentiel pour suivre et contrôler la mise en œuvre du projet pendant les supervisions techniques tant sur le terrain qu'au bureau. Ils doivent en outre encourager l'OE de l'Emprunteur à procéder de même pour exécuter le projet de manière proactive et veiller à ce que toutes les méthodes et procédures de passation de marchés demeurent adaptées tout au long de la période d'exécution du projet et permettent à l'Emprunteur de réaliser un rapport qualité-prix optimal.
- 10.2.7. **Mise à jour du PPM pendant la mise en œuvre du projet** : Au cours de l'exécution du projet, chaque fois que le Chargé de projet reçoit une mise à jour du PPM détaillé proposé par l'Emprunteur, le Chargé de projet et le SPM procèdent à son examen. Lorsqu'un accord est conclu, le Chargé de projet le fait approuver conformément à la MDP en vigueur. Lorsque l'AF doit être modifié, un accord est conclu avec l'Emprunteur, et cette modification est effectuée avec l'aide du juriste conformément à la MDP.
- 10.2.8. La version simplifiée révisée du PPM qui en résulte est publiée en remplacement de l'ancienne version sur le site Web de la Banque.

ANNEXE A - Diagramme de Planification de la Passation de Marchés



ANNEXE B1 - Délais de traitement (Biens, Travaux)

Délais standard du processus de passation de marchés pour l'acquisition des biens et travaux dans le cadre des projets financés par le Groupe de la Banque utilisant les Méthodes et procédures de passation de marchés de la Banque¹

	Activités du processus de passation de marchés	Détails explicatifs des activités	Nombre de jours minimum	Nombre de jours maximum ²
1	Publication de l'Avis général de passation de marché (AGPM) dans UNDB Online	Adoption de l'AGPM durant les négociations. Publication de l'AGPM après approbation de l'autorité compétente. Publication de l'Avis d'Appel d'Offres (AAO) lorsque les documents d'appel d'offres sont prêts, mais pas avant la date de publication de l'AGPM	7	14
2	Préparation des Documents d'appel d'offres par l'Organe d'exécution (OE)	14 à 28 jours, en utilisant les Dossiers types d'appel d'offres (DTAO), selon la complexité de l'acquisition, y compris la communication du Dossier d'appel d'offres à la Banque	14	28
3	Avis de non-objection de la BAD aux Documents types d'appel d'offres	7 à 14 jours	7	14
4	Publication de l'AAO. Dans le cadre de l'AOI, la publication dans UNDB Online est requise Délai de publication dans UNDB Online (pour l'AGPM et l'AAO dans le cadre de l'AOI) Dans le cas de l'AON : dans la presse nationale	Doit s'effectuer au même moment que le Dossier d'appel d'offres (ou le Dossier de pré-qualification) est mis en vente par l'Organe d'exécution 7 à 14 jours (4 jours afin que l'Organe d'exécution prépare la publicité et l'envoi à la Banque ; 2 à 4 jours afin que SNFI approuve la publicité et l'envoi à UNDB ; délai de 2 à 6 jours pour la publication par UNDB) Lorsque les dossiers d'appel d'offres sont prêts (voir ligne 2 ci-dessus)	7	14
5a	Préparation du Dossier de Pré-qualification	14 à 21 jours (Dossier Type de Pré-qualification), incluant l'envoi du Dossier de Pré-qualification à la Banque	14	21
5b	Avis de non-objection de la BAD au Dossier de Pré-qualification	7 à 14 jours au maximum	7	14
5c	Période de candidature : Préparation de la candidature de Pré-qualification, à partir de la publication de l'AAO	Délai suffisant — 6 semaines = 42 jours à partir de la date de publication dans UNDB	42	42
5d	Évaluation de la pré-qualification par l'Organe d'exécution	7 jours, y compris l'envoi du Rapport d'évaluation à la Banque	7	7

¹ Source - Rapport fiduciaire annuel pour l'année 2017. Département des services fiduciaires et de l'inspection. Décembre 2018.

² Le Cadre de Passation de Marchés de la Banque de 2015 étant fondé sur les politiques, ne prévoit pas de calendrier. Un délai suffisant doit être prévu pour que les soumissionnaires puissent préparer des offres/propositions recevables et conformes. Ces chiffres ne sont que des normes établies en matière de délais de traitement pour guider les praticiens afin d'assurer une bonne pratique.

5e	Avis de Non-Objection de la Banque à l'évaluation des préqualifications.	7 jours	7	14
6a	Période d'appel d'offres : Préparation des offres par les soumissionnaires, de la date de publication de l'appel d'offres à la date limite de dépôt des offres. ➤ Appel d'offres ouvert (AOO) international ➤ Appel d'offres restreint (AOR) international ➤ AOO National ➤ AOR National / Consultation des Fournisseurs (CF)/ Demande de Cotations (DC)	Délai suffisant — 6 semaines = 42 jours à partir de la date de publication dans UNDB Online. 12 semaines = 84 jours pour les grands travaux 6 semaines = 42 jours à compter de la date de publication des documents d'appel d'offres Un délai suffisant pour que les soumissionnaires puissent préparer leurs réponses Un délai suffisant pour que les soumissionnaires puissent préparer leurs réponses Un délai suffisant pour que les soumissionnaires puissent préparer leurs réponses	42 42 21 14	84 84 28 28
6b	Évaluation des offres par l'OE dans le cadre de l'AOI & AOR (International) et AON	28 à 35 jours, selon la complexité de l'acquisition, incluant l'envoi du Rapport d'évaluation à la Banque	28	35
6c	Évaluation des offres par l'OE dans le cadre de l'AO restreint national – Consultation des Fournisseurs	7 jours	7	7
6d	Avis de Non-Objection de la Banque à l'évaluation des offres	14 à 21 jours	14	21
7	Attribution du contrat par l'Organe d'exécution	Dans les 14 jours suivant l'Avis de Non-Objection de la Banque	7	14
8	Approbation de la signature du contrat par le Bénéficiaire	7-28 jours maximum après l'attribution du marché (selon les niveaux d'autorité pour l'approbation de la signature du contrat)	7	28

Délai total de passation de marchés, de la date de publication de l'AAO à la date de signature du Contrat :

AOO international avec préqualification :

minimum de 182 jours (6,1 mois) ;

maximum de 294 jours (9,8 mois)

AOO international sans préqualification :

minimum de 105 jours (3,5 mois) ;

maximum de 196 jours (6,5 mois)

AOR International :

minimum de 77 jours (2,6 mois) ;

maximum de 126 jours (4,2 mois)

ANNEXE B2 - Délais de traitement (Services de Consultants)

Délais standard du processus de passation de marchés pour l'acquisition des services de consultants dans le cadre des projets financés par le Groupe de la Banque, en utilisant les PMPs de la Banque³

	Activités de traitement de la passation de marchés	Détails explicatifs des activités	Nombre minimum de jours	Maximum Nombre de jours ⁴
1	Publication d'un Avis général de passation de marché (AGPM) dans UNDB Online (avec les biens, les travaux et les services de consultants combinés, en demandant des manifestations générales d'intérêt (MI) pour des services	Adoption de l'AGPM durant les négociations. Publication après approbation de l'autorité compétente. Publication d'un Avis d'Appel d'Offres (AAO) lorsque les documents de Demande de propositions sont prêts, mais pas avant la date de publication de l'AGPM.	7	14
2	La publication de l'AAO à des fins d'avis à Manifestations d'intérêt dans UNDB Online est requise pour les contrats d'une valeur supérieure à 200 000 UC.	14 jours (4 jours pour que l'Organe d'exécution (OE) prépare la publicité et l'envoi à la Banque ; 3 jours pour la Banque pour examen et transmission à SNFI, afin que celui-ci approuve la publicité et l'envoi à UNDB Online; et délai de 7 jours aux fins de publication en ligne par UNDB)	7	14
3	Délai de réception des Manifestations d'intérêt après (i) publication dans UNDB Online. (ii) publication dans la presse nationale pour les contrats d'une valeur inférieure à 200 000 UC (200 000 euros)	14 jours	14	14
4	Établissement par l'OE de la liste restreinte sur la base de l'AGPM et de l'AAO, ainsi que des qualifications requises pour mettre en œuvre les Termes de référence (TDR)	7 jours, y compris la communication de la liste restreinte à la Banque	7	14
5	Élaboration des Termes de référence (TDR) et de la Demande de propositions (DDP) par l'OE	14 à 35 jours, selon la complexité de la mission, y compris la correspondance avec la Banque	14	35
6	Avis de Non-Objection de la Banque à la liste restreinte, aux TDR et à la DDP	7 à 14 jours	7	14
7	Préparation des propositions par les Firmes de Consultants sur la Liste restreinte	4 semaines = 28 jours à 3 mois = 90 jours, selon la complexité de la préparation et de la soumission des propositions. 45 jours	28	90
8	Ouverture et évaluation des propositions techniques par l'OE	14 à 28 jours, y compris la présentation du Rapport d'évaluation des propositions techniques à la Banque	14	28
9	Avis de Non-Objection de la Banque à l'évaluation technique	7 à 14 jours au maximum	7	14

³ Source - Rapport fiduciaire annuel pour l'année 2017. Département des services fiduciaires et de l'inspection. Décembre 2018.

⁴ Le Cadre de Passation de Marchés de la Banque de 2015 étant fondé sur les politiques, ne prévoit pas de calendrier. Un délai suffisant doit être prévu pour que les soumissionnaires puissent préparer des offres/propositions recevables et conformes. Ces chiffres ne sont que des normes établies en matière de délais de traitement pour guider les praticiens afin d'assurer une bonne pratique.

10	Ouverture publique des propositions financières, évaluation, et élaboration du rapport final par l'OE	7 à 21 jours, y compris la présentation du Rapport d'évaluation technique et financière combiné à la Banque	7	21
11	Invitation de la Firme de Consultants retenue aux négociations par l'OE	7 à 14 jours à compter de la réception de l'Avis de Non-Objection de la Banque	7	14
12	Avis de non-objection au procès-verbal des négociations et au Contrat négocié.	7 jours à compter de la fin des négociations	7	14
13	Attribution du Contrat par l'OE	Dans les 7 jours suivant l'Avis de Non-Objection de la Banque	7	7
14	Signature du Contrat	7 à 28 jours à compter de la date de réception de l'Avis de Non-Objection de la Banque	7	28

Délai total de passation de marché, de la préparation des Termes de référence et des documents de Demande de propositions à la Signature du contrat :

Contrats d'une valeur supérieure à 200 000 UC (200 000 euros) :

minimum de 126 jours (4,2 mois) ; maximum de 293 jours (9,8 mois)

Contrats d'une valeur inférieure à 200 000 UC (200 000 euros) :

minimum de 112 jours (3,7 mois) ; maximum de 258 jours (8,6 mois)

ANNEXE C1 - Plan détaillé de Passation de Marchés (Biens, Travaux)

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISITION DES BIENS & TRAVAUX

Pays / Organe d'Exécution :

Nom du Projet/Programme :

Numéro du Prêt/Don :

[illegible]

* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

+	Si applicable
---	---------------

** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

*** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

*+ Conserver le « Plan » de passation de marchés convenu lors de la négociation et approuvé par les Conseils d'administration, pendant toute la durée du projet

« Révisé » inclut toutes les mises à jour et révisions

Enregistrer la date « réelle » d'achèvement de l'activité

*++ Le Modèle doit être adapté au processus d'appel d'offres en deux étapes en ajoutant des colonnes appropriées pour la deuxième étape de la période d'appel d'offres séquentielle et du processus d'évaluation des soumissions

*+++ Indiquer la monnaie du contrat

ANNEXE C2 - Plan détaillé de Passation de Marchés (Consultants)

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISITION DES SERVICES DE CONSULTANTS

Pays / Organe d'Exécution :

Nom du Projet/Programme :

Numéro du Prêt/Don :

Informations de base						AMI		Termes de Référence		Liste Restreinte			Demande de Propositions (DDP)				Évaluation des Propositions						Finalisation du Contrat			
Système de passation de marchés*	Mode de Sélection	Forfait ou Temps Passé	Coût Estimatif (UC)**	Contrôle et Audit – Examen Préalable / à Postérieur de la Banque***	Plan Révisé ou Mis à Jour**	Date de publication	Date de Clôture	Date de Soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de Soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date de Soumission des Documents de DDP	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Émission de la DDP	Date de limite de de dépôt / d'ouverture des Propositions	Date de soumission du Rapport technique	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Ouverture des Propositions financières	Date de Soumission du Rapport combiné	Date de l'Avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (insérer la monnaie) *++	Date de Signature du Contrat	Date d'Achèvement du Contrat
					Plan							Plan										Plan				
					Révisé							Révisé										Révisé				
					Mis à jour							Mis à Jour										Mis à Jour				
					Plan							Plan										Plan				
					Révisé							Révisé										Révisé				
					Mis à jour							Mis à Jour										Mis à Jour				
					Plan							Plan										Plan				
					Révisé							Révisé										Révisé				
					Mis à jour							Mis à Jour										Mis à Jour				
					Plan							Plan										Plan				
					Révisé							Révisé										Révisé				
					Mis à jour							Mis à Jour										Mis à Jour				
					Plan							Plan										Plan				
					Révisé							Révisé										Révisé				
					Mis à jour							Mis à Jour										Mis à Jour				
Coût Total					Plan							Plan										Plan				
					Révisé							Révisé										Révisé				
					Mis à jour							Mis à Jour										Mis à Jour				

* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (Méthodes et Procédures du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

** Coût total du Package; du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

*** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

*+ Conserver le « Plan » de passation de marchés convenu lors de la négociation et approuvé par les Conseils d'administration, pendant toute la durée du projet

« Révisé » inclut toutes les mises à jour et révisions

Enregistrer la date « réelle » d'achèvement de l'activité

*++ Indiquer la monnaie du contrat

ANNEXE D - Plan simplifié de Passation de Marchés

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Nom du Projet/Programme :

Numéro du Prêt/Don :

[illegible]

* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

*** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

*+ Indiquer la monnaie du contrat

ANNEXE E - Plan de Passation de Marchés (pour l'Accord de financement)

Système de passation de marchés ⁱ	Package n°.	Description du Package	Catégorie ⁱⁱ	Lot n°. ⁱⁱⁱ	Description du lot ^{iv}	Coût estimatif (Insérer une monnaie)	Mode de passation de marchés	Pré- ou post- Qualification	Contrôle de la passation de marchés ^v	Date de publication prévue de l'AAO

ⁱ Insérer les systèmes de passation de marchés utilisés dans le cadre du projet (Système de passation de marchés de l'Emprunteur et/ou Méthodes et procédures de la Banque et/ou de Tierce partie)

ⁱⁱ Indiquer : Biens / Travaux / Services de Consultants / Services autres que les Services de Consultants

ⁱⁱⁱ Si applicable

^{iv} Si applicable

^v Indiquer (Audit des acquisitions / Examen a posteriori / Examen préalable)
